


PROYECTO

Capacidad De Equipo

N	Horas
Personas	4
Horas por semana	16
Semanas por sprint	2
Factor productividad	0.8
Capacidad (horas)	96.0
PHU por sprint	4.66

NOMBRES:
Yeferson Linares
Brayan Mikoulist
Joseph Vargas
Yakelin Ariza

Diagrama

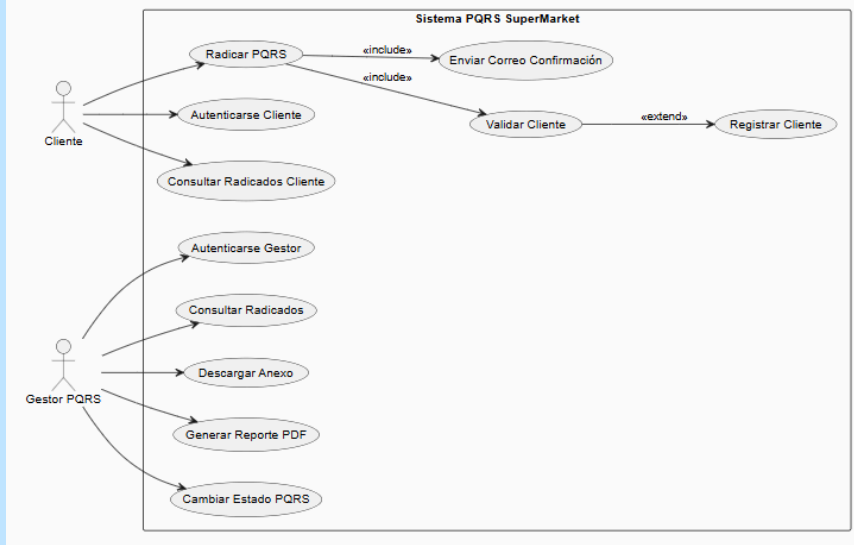

PERT

Tarea	TP (Pesimista)	TE (Esperado)	TO (Optimista)	Resultado	
Elaborar doc. HU		2	1.5	1	1.5
Prototipo Mockup		2	1.5	1	1.5
Arquitectura		2	1.5	1	1.5
Implementar BD		3	2	1	2.0
Desarrollar backend		5	3	2	3.2
Desarrollar frontend		4	3	2	3.0
Integrar frontend/backend		3	2	1	2.0
Pruebas unitarias		2.5	2	1	1.9
Pruebas QA		2	1.5	1	1.5
Manual usuario/técnico		1.5	1	0.5	1.0
Desplegar		2	1.5	1	1.5
Total estimado					20.58

Funcionalidad	PHU estimado	Planning Poker
Consultar Radicados	20.58	16

Planning poker

Funcionalidad	Dificultad	Horas Reales	Sprint
Autenticarse Cliente	2	41.2	sprint 1 (2)
Autenticarse Gestor	2	41.2	sprint 1(2)
Descargar Anexo	2	41.2	sprint 1(0.66), sprint 2(1.34)
Consultar Radicados Cliente	1	20.6	sprint 2(1)
Consultar Radicados Gestión	1	20.6	Sprint 2(1)
Cambiar Estado PQRS	3	61.7	Sprint 2(1.32), Sprint 3(1.68)
Generar Reporte PDF	3	61.7	Sprint 3(1.66), sprint 4(1.34)
Radicar PQRS	2	41.2	Sprint 4(2)
